


左官工事(海鼠壁)

現場もいよいよ大詰めです。

建物外部の足場を解体するために、急ピッチに進んでいます。

海鼠壁(なまこかべ)の紐(ひも)漆喰が、良く引っ付く様に棕櫚縄(しゅろなわ)を張り、棕櫚縄の上に漆喰を付けていきます。

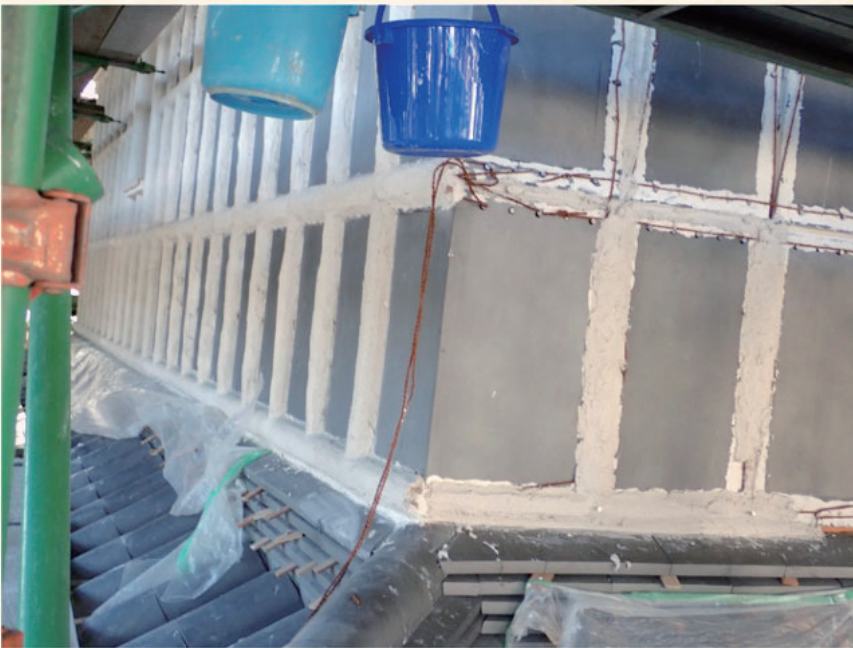

更にもうその上に、紐漆喰を手造りの罎(こて 写真右下)でかまぼこ状に均していきます。



紐漆喰に定規に沿わせて、真っ直ぐにしながら海鼠罎(なまこごて 写真右下)で中塗をします。



いよいよ紐漆喰の上塗りです。
完成間近です。



海鼠壁が完成しました。
きれいに仕上がってますね。

